



Miércoles, Septiembre 30 2026



1-2

Vanguardia > Santander > Barrancabermeja

Martes 29 de septiembre de 2026 - 03:06 PM

Recursos adicionales para terminar la PTAR San Silvestre superan el valor del contrato inicial de la obra

Aguas de Barrancabermeja calculó en \$156.690 millones los recursos adicionales que se requieren para culminar la PTAR San Silvestre. El monto supera en \$41.258 millones el valor inicial del contrato de construcción.



Agréguelos como fuente favorita de Google




La PTAR San Silvestre continúa sin una reactivación efectiva de las obras, mientras Aguas de Barrancabermeja estudia la posible siniestralidad del contrato. Archivo/Suministrada/Vanguardia

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes

Terminar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre requiere una suma que ya supera el valor con el que fue contratado inicialmente el proyecto. Según un documento presentado por Aguas de Barrancabermeja a **Ecopetrol**, la empresa estimó en \$156.690 millones los recursos adicionales necesarios para culminar la construcción, mientras que el contrato de obra, firmado en 2016, tuvo un valor inicial de \$115.432 millones.

En otras palabras, los recursos que hoy se estiman necesarios para terminar la parte pendiente de la planta equivalen a cerca de 1,36 veces el valor con el que inicialmente fue contratado todo el proyecto. La comparación, sin embargo, debe tener en cuenta que el contrato recibió posteriormente adiciones presupuestales.

La solicitud de recursos adicionales quedó consignada en un documento que Aguas de Barrancabermeja presentó ante **Ecopetrol** para revisar las alternativas de financiación necesarias para culminar la construcción. En una respuesta fechada el 16 de marzo de 2026, la petrolera solicitó a la empresa información técnica, jurídica y financiera que permitiera sustentar el monto requerido.

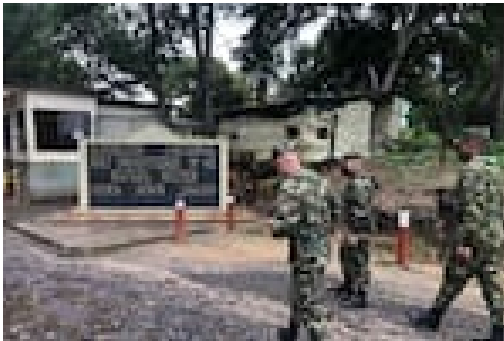

→ Vea también:

[Denuncian presuntas malas condiciones de salubridad en batallón de Cimitarra](#)





La PTAR San Silvestre continúa sin una reactivación efectiva de las obras, mientras Aguas de Barrancabermeja estudia la posible siniestralidad del contrato. Archivo/Suministrada/Vanguardia

La cifra se conoce públicamente cuando la planta todavía tiene un tramo importante de obra por ejecutar. Con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto registraba un avance físico ejecutado y verificado del 64,57 %, frente al 98,18 % previsto en la programación. Esto significa que más de una tercera parte del proyecto continúa pendiente de ejecución.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, reconoció la compleja situación que enfrenta el proyecto y la magnitud de los recursos que serían necesarios para llevar la obra a su terminación.

"Hay una situación muy compleja. Es una obra que cambió muchas veces de contratista y hoy lo que estamos evidenciando es que el contratista no tiene los recursos para continuar con la obra. Ya se hizo ese análisis de ingeniería y lo que arrojó es que se requieren cerca de 150.000 millones de pesos para terminar esta PTAR San Silvestre. Entonces se requiere que **Ecopetrol**, que es un socio en este proyecto que ha puesto más de la mitad de la plata, pues también nos ayude a poder conseguir los recursos para terminar de financiar esta obra", dijo el mandatario.

Convocan reunión de seguimiento

La próxima reunión de seguimiento de la PTAR San Silvestre fue convocada luego de una solicitud presentada por la veeduría Lupa Ciudadana, que realiza seguimiento al proyecto. El encuentro quedó programado para el 8 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la planta.



La PTAR San Silvestre continúa sin una reactivación efectiva de las obras, mientras Aguas de Barrancabermeja estudia la posible siniestralidad del contrato. Archivo/Suministrada/Vanguardia

A la reunión están convocados representantes de la Alcaldía de Barrancabermeja, la Secretaría de Infraestructura, la Personería, la Procuraduría, **Ecopetrol**, el contratista y la interventoría. Durante el encuentro se espera revisar el estado actual de la obra, las condiciones necesarias para su eventual reactivación y la situación de los recursos requeridos para culminarla.

Además, la veeduría ha solicitado información, mediante derechos de petición, sobre el avance físico y financiero de la obra, los recursos disponibles y las decisiones adoptadas alrededor del proyecto.

Diez años después, la PTAR sigue sin terminarse

La PTAR San Silvestre fue contratada en 2016 como una de las principales obras de saneamiento de Barrancabermeja. El proyecto busca tratar cerca del 90 % de las aguas residuales de la ciudad y reducir los vertimientos que actualmente llegan al río Magdalena y a otros cuerpos hídricos.



→ Vea también:

[Gobierno anuncia aumento de pie de fuerza, nuevas estaciones y tecnología contra el crimen en Magdalena Medio](#)



Sin embargo, diez años después de la firma del contrato, la planta todavía no está terminada. Durante varios meses, uno de los obstáculos para continuar con el proyecto fue la falta de interventoría. Esa situación se resolvió en octubre de 2025, cuando fueron contratados por más de \$3.400 millones los servicios de una nueva interventoría, la Unión Temporal PTAR BCA, que inició labores el 30 de octubre. El contrato de obra fue reiniciado formalmente el 5 de noviembre de ese mismo año.


Pese al reinicio formal del contrato, los trabajos no lograron reactivarse de manera efectiva. Al solicitar medidas en julio de 2026, la interventoría dejó constancia de que habían transcurrido ocho meses desde el inicio de sus labores sin que se concretara la reanudación física de la construcción y pidió a Aguas de Barrancabermeja estudiar la posible ocurrencia de un siniestro contractual ante los presuntos incumplimientos.



Uno de los principales problemas identificados está relacionado con la situación financiera del contratista. La empresa mantiene deudas superiores a \$3.000 millones con proveedores, enfrenta procesos judiciales y medidas cautelares sobre recursos relacionados con el contrato y ha manifestado que requiere un pago anticipado para retomar las actividades.

En febrero de 2026, el contratista solicitó un anticipo por \$20.627 millones. Aguas de Barrancabermeja determinó que no se encontraban acreditadas las condiciones técnicas, financieras y contractuales necesarias para autorizar ese desembolso.

Hoy las obras siguen paralizadas.



Noticias relacionadas:

[Colombia](#)[Barrancabermeja](#)[Santander](#)[Ptar San Silvestre de Barrancabermeja](#)[Medio Ambiente](#)

[elefante blanco](#)[Aguas Residuales](#)[Aguas de Barrancabermeja](#)[Ecopetrol](#)[Síguenos en Google Discover](#)[Únase a nuestro canal de WhatsApp](#)[Recíbanos en Google News](#)

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes

¿Cuánto ganarás con Bancolombia CFD? [Calcula]

Comienza a invertir | Patrocinado

[Haz clic aquí](#)

Calcula cuánto podrías ganar invirtiendo solo \$103 en Bancolombia CFD

Comienza a invertir [CO] | Patrocinado

[Haz clic aquí](#)

Petro no se quedó callado: pedirá réplica a De la Espriella y le lanza duras acusaciones

También sostuvo que el nivel de endeudamiento pasó del 61 % al 58 % del PIB. “Eso demuestra eficiencia de nuestro gobierno”, afirmó.

Vanguardia

Bancolombia CFD: Calcula cuánto podrías ganar invirtiendo solo \$104

Scsete | Patrocinado

[Ver oferta](#)

Noticias del día



COLOMBIA

Piden investigar penalmente a María José Pizarro por el escándalo de la Ungrd



COLOMBIA

Doble homicidio en Los Patios deja dos hombres muertos tras ataque a bala



COLOMBIA

Seis bienes de Charlie Zaa quedan bajo extinción de dominio por decisión judicial

Tendencias



TENDENCIAS
Horóscopo del miércoles 30 de septiembre de 2026: así estarán los astros

CINE
Avengers: Endgame' vuelve a liderar la taquilla con su reestreno y recauda US\$86 millones

SANTANDER
Santander viajará a Cafés de Colombia Expo 2026: hay 16 cupos para caficultores

Vanguardia

Síguenos en:      

Servicios	▼
Secciones	▼
Clasificados	▼
Publicaciones	▼

Todos los derechos reservados Galvis Ramirez & Cia S.A.S. - 2026 - Bucaramanga - Colombia. Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular. Términos y condiciones
Política SAGRILIFT | Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) | Denuncia de hechos Sagrilaft y PTEE

